

平成28年度 JR伊予西条駅バリアフリー化事業の進捗状況について

1 事業の目標及び効果

伊予西条駅の全ホーム2カ所において「移動等円滑化された経路」を整備し、駅構内に「誘導案内設備」及び「多機能トイレ」を設置することにより、移動及び利用に係る安全性及び利便性の向上が図られる。

2 事業内容等

	平成27年度	平成28年度
主な事業内容	乗換こ線橋新設 (基礎杭、桁) 電気設備支障移転 ホーム上家撤去等	乗換こ線橋新設 (橋脚、桁架設) エレベーター新設 点字ブロック 案内設備 電気設備復旧 ホーム上家復旧 多機能トイレ

3 西条駅構内写真



1 番ホーム上家撤去




2・3 番ホーム上家撤去



うちぬきモニュメント撤去後
桁の橋脚 基礎杭打設完了

平成28年度事業概略図（予讃線：伊予西条駅）

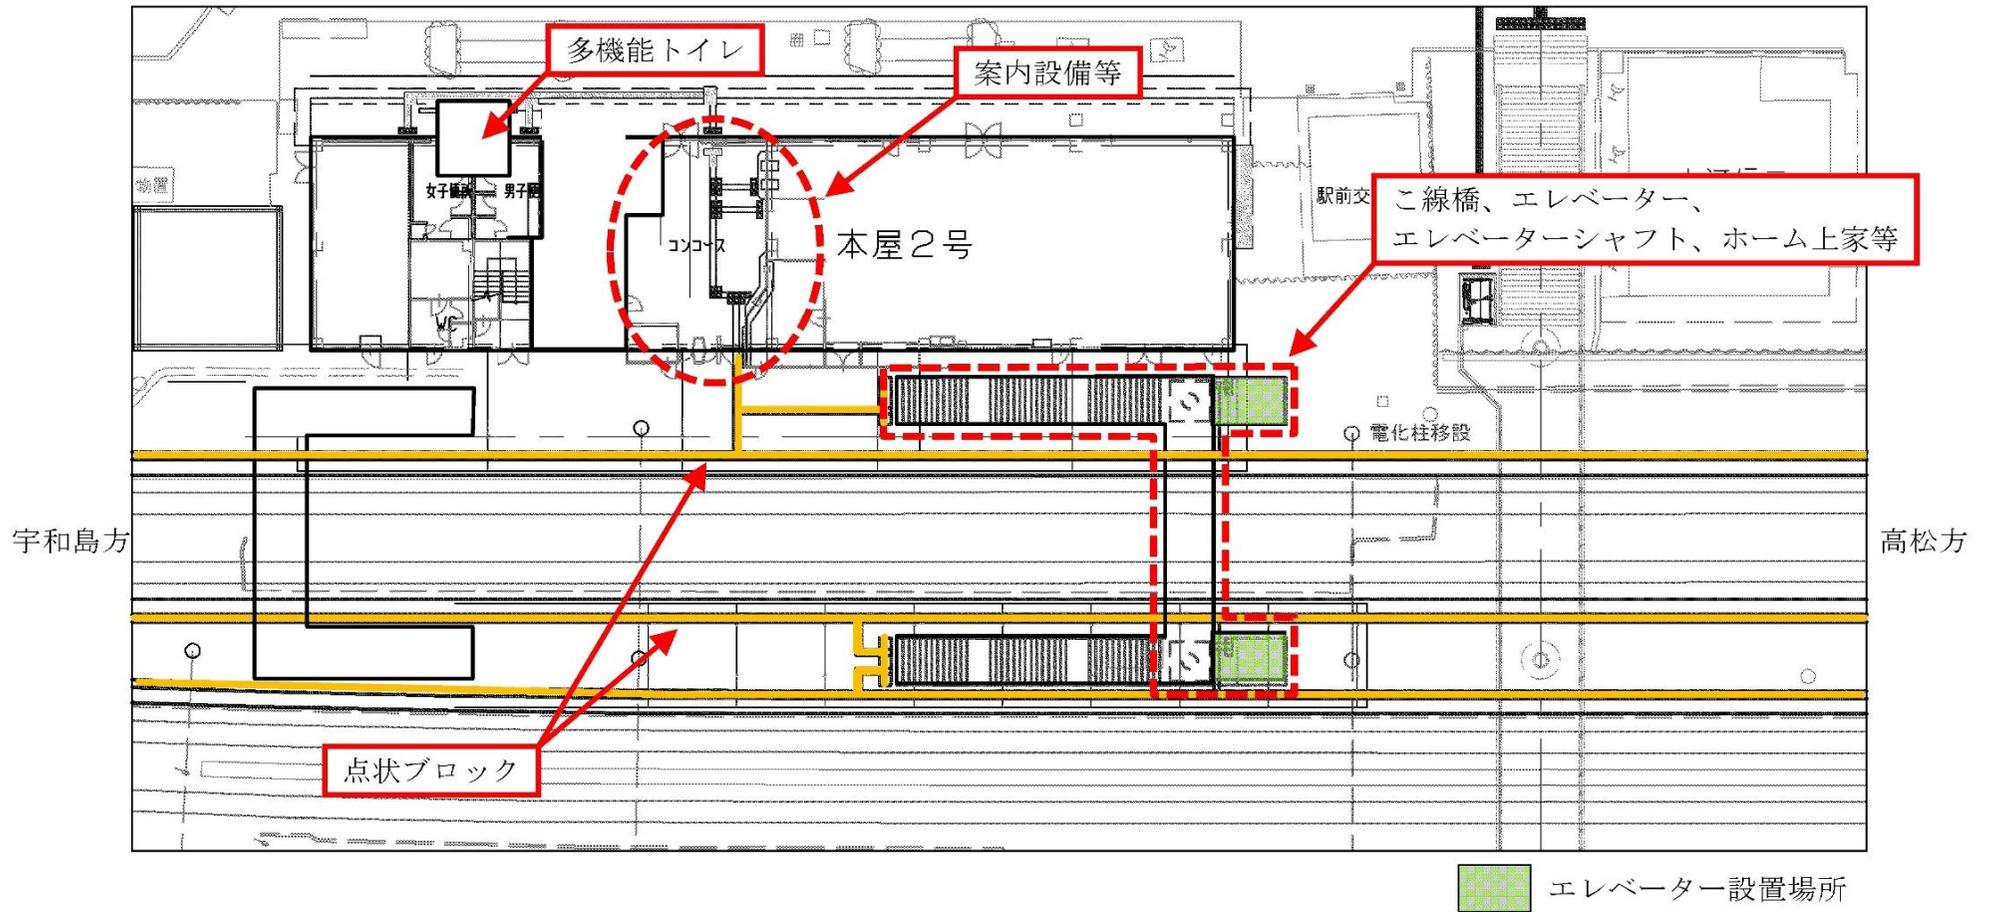

【今後の工事工程】

- ・ H28.11月～12月：基礎杭打設
- ・ H29. 1月～ 2月：橋脚基礎コンクリート打設
- ・ H29. 3月上旬～中旬：橋脚設置
- ・ H29. 3月下旬～ 4月：こ線橋桁架設
- ・ H29. 5月～ 6月：こ線橋上家、エレベーター設置
